



AMASYA İLİ

2003 - 2020 YILLARI ARASI

KAMU YATIRIMLARI



2003 - 2020 YILLARI ARASI SEKTÖRLERE GÖRE KAMU YATIRIMLARI



İlimizde; 8.688 projede 9,6 Milyar TL yatırım yapılmıştır.

SEKTÖRÜ	PROJE SAYISI	TOPLAM PROJE TUTARI (TL)	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (TL)
TARIM	1.394	2.136.711.707,08	1.453.207.080,29
MADENCİLİK	37	143.711.925,00	62.121.988,65
İMİALAT	0	0,00	0,00
ENERJİ	576	910.975.298,71	396.285.791,85
ULAŞTIRMA-HABERLEŞME	4.476	4.209.789.733,16	3.498.657.016,18
TURİZM	129	150.465.841,05	130.437.699,09
KONUT	25	597.751.980,00	597.751.980,00
EĞİTİM	262	607.756.252,37	460.266.276,62
SAĞLIK	24	93.981.360,00	93.981.360,00
DİĞER KAMU HİZMETLERİ	1.765	772.470.309,72	651.024.461,62
TOPLAM	8.688	9.623.614.407,09	7.343.733.654,30

KURUMU	YATIRIM TÜRÜ	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (TL)
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	YARDIM	152.240.718,42
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	HİBE+DESTEK+KREDİ	708.124.700,00
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK)	DESTEK	36.653.064,76
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ	TEŞVİK	143.772.547,04
TOKAT-VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	YARDIM	5.938.926,73
KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	DESTEK	14.160.818,00
AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	HİBE+KREDİ	1.201.326,00
ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA)	HİBE	27.386.785,46
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI	YARDIM+KREDİ+TEŞVİK	185.164.144,03
MAHALLİ İDARELER	YARDIM+KREDİ+TEŞVİK	0,00
TOPLAM		1.274.643.030,44

GENEL TOPLAM (Bugüne kadar yapılan harcama, yardım, hibe, destekleme kredi ve teşviklerde içindedir.)	8.618.376.684,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------



İlimizde Milli Eğitim Müdürlüğünce 122 adet projede toplam 298.279.995,29 TL yatırım yapılmıştır.

Merkez Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi



Proje Tutarı (TL)	7.483.000,00
Toplam Harcama (TL)	7.482.915,20
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	24 Derslik +200 Öğrenci Pansiyonu
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Merkez Öğretmenevi Bina Onarım İnşaatı



Proje Tutarı (TL)	1.028.379,99
Toplam Harcama (TL)	993.458,85
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	97

Seyhcu Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu



Proje Tutarı (TL)	3.494.741,54
Toplam Harcama (TL)	3.072.876,33
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	20 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	88

Merkez Şehitler Ortaokulu Ek Bina Yapımı



Proje Tutarı (TL)	2.873.452,45
Toplam Harcama (TL)	2.682.017,13
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	20 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	93

Merkez Mehmet Varinli İlkokulu Ek Bina Yapımı



Proje Tutarı (TL)	2.816.064,29
Toplam Harcama (TL)	2.775.511,35
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	20 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

Merzifon İstiklal İlkokulu



Proje Tutarı (TL)	3.188.937,35
Toplam Harcama (TL)	3.093.625,90
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	16 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	97

Merkez Bahçeleriçi Ortaokulu (Hizmet Binası)

Proje Tutarı (TL)	9.393.325,50
Toplam Harcama (TL)	8.883.844,03
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	95

Suluova Mehmet Bilgili Ortaokulu Ek Bina Yapımı



Proje Tutarı (TL)	4.476.000,00
Toplam Harcama (TL)	4.424.805,87
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	20 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

Merkez Şamlar Mahallesi Anaokulu Yapımı



Proje Tutarı (TL)	1.820.166,22
Toplam Harcama (TL)	1.734.695,94
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Kapasite	8 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	95

Merzifon Namık Kemal Ortaokulu Ek Bina Yapımı



Proje Tutarı (TL)	4.071.600,00
Toplam Harcama (TL)	1.926.329,21
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2020
Kapasite	20 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	47
Nakdi Gerçekleşme (%)	47

Taşova Halk Eğitim Merkezi Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	3.428.080,74
Toplam Harcama (TL)	747.640,65
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2020
Kapasite	24 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	22
Nakdi Gerçekleşme (%)	22

Merzifon Yeni Mahalle Anaokulu



Proje Tutarı (TL)	1.866.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.827.854,31
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	8 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

Gümüşhacıköy Cumara Mahallesi İlkokulu



Proje Tutarı (TL)	2.458.047,00
Toplam Harcama (TL)	2.361.034,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	10 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	96

Taşova Doğu Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu



Proje Tutarı (TL)	2.906.269,00
Toplam Harcama (TL)	2.890.891,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	16 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

Suluova İmam Hatip Ortaokulu



Proje Tutarı (TL)	2.452.484,00
Toplam Harcama (TL)	2.427.539,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	16 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99

Merzifon Kız İmam Hatip Lisesi



Proje Tutarı (TL)	2.690.431,00
Toplam Harcama (TL)	2.643.771,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	16 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

Suluova Anadolu İmam Hatip Lisesi



Proje Tutarı (TL)	6.511.410,06
Toplam Harcama (TL)	6.402.886,56
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	16 Derslik +100 Öğrenci Pansiyonu
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

Merzifon Mesleki ve Teknik Lisesi



Proje Tutarı (TL)	2.676.050,00
Toplam Harcama (TL)	2.627.266,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Kapasite	24 Derslik
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



Proje Tutarı (TL)	20.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	13.746.000,00
Başlama Tarihi	2014
Bitiş Tarihi	2017
Kapasite	32 Derslik+200 Öğrencilik Pansiyon +1Spor Salonu+3Atölye

Merzifon Fen Lisesi Spor Salonu ve Tiyatro Binası Yapımı



Proje Tutarı (TL)	1.622.500,00
Toplam Harcama (TL)	1.482.359,76
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2017

İlimizde Amasya Üniversitesince 15 adet projede toplam 148.467.614,11 TL yatırım yapılmıştır.

Amasya Üniversitesi Rektörlük Binası




Proje Tutarı (TL)	16.592.269,53
Toplam Harcama (TL)	16.592.269,53
Başlama Tarihi	28.04.2014
Bitiş Tarihi	31.05.2016

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	39.957.750,00
Toplam Harcama (TL)	12.404.536,10
Başlama Tarihi	31.03.2017
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	45
Nakdi Gerçekleşme (%)	31

Taşova Yüksel Akın MYO Yemekhane ve Kantin Binası Yapımı

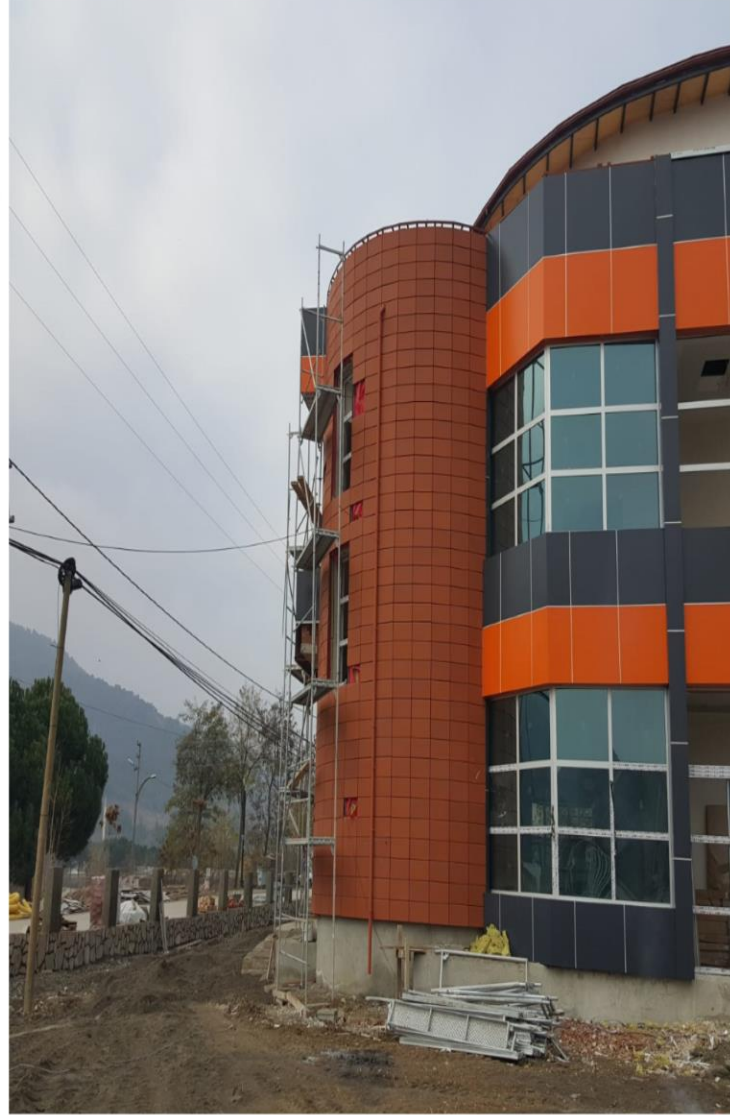

Proje Tutarı (TL)	7.121.126,52
Toplam Harcama (TL)	7.121.126,52
Başlama Tarihi	25.04.2018
Bitiş Tarihi	08.12.2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Amasya Üniversitesi Merzifon MYO Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	12.804.604,22
Toplam Harcama (TL)	12.804.604,00
Başlama Tarihi	25.07.2017
Bitiş Tarihi	15.11.2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İkmal İşi



Proje Tutarı (TL)	11.890.126,85
Toplam Harcama (TL)	11.890.126,85
Başlama Tarihi	10.01.2017
Bitiş Tarihi	10.10.2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler MYO



Proje Tutarı (TL)	6.521.107,64
Toplam Harcama (TL)	6.521.107,64
Başlama Tarihi	08.10.2014
Bitiş Tarihi	19.07.2016

Amasya Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu



Proje Tutarı (TL)	10.026.232,54
Toplam Harcama (TL)	10.026.232,54
Başlama Tarihi	16.09.2013
Bitiş Tarihi	05.11.2015

İlimize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 19 projede 96.072.664,08 TL yatırım yapılmıştır.

12 Haziran Şehir Stadyumu



Proje Tutarı (TL)	5.954.214,00
Toplam Harcama (TL)	5.954.214,00
Başlama Tarihi	01.11.2012
Bitiş Tarihi	13.08.2014
Kapasite (Kişi)	7.500

Amasya Spor Salonuna İki Kulvarlı Curling Oyun Alanı Yapımı



Proje Tutarı (TL)	1.801.682,64
Toplam Harcama (TL)	1.801.682,64
Başlama Tarihi	11.06.2018
Bitiş Tarihi	29.09.2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Suluova Gençlik Merkezi



Proje Tutarı (TL)	3.232.349,67
Toplam Harcama (TL)	3.232.349,67
Başlama Tarihi	20.02.2017
Bitiş Tarihi	17.12.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Amasya Fındıklı Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası



Proje Tutarı (TL)	1.306.402,43
Toplam Harcama (TL)	1.259.223,17
Başlama Tarihi	20.06.2016
Bitiş Tarihi	15.01.2017
Kapasite (Kişi)	500
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	97



Taşova Gençlik Merkezi



Proje Tutarı (TL)	461.060,00
Toplam Harcama (TL)	461.060,00
Başlama Tarihi	09.09.2014
Bitiş Tarihi	06.02.2015

Amasya Gençlik Merkezi



Proje Tutarı (TL)	1.003.000,00
Toplam Harcama (TL)	972.185,27
Başlama Tarihi	09.05.2014
Bitiş Tarihi	29.01.2015

Amasya 2.500 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu



Proje Tutarı (TL)	14.116.340,00
Toplam Harcama (TL)	14.116.340,00
Başlama Tarihi	11.05.2012
Bitiş Tarihi	16.05.2015



Merzifon Gençlik Merkezi



Proje Tutarı (TL)	833.914,00
Toplam Harcama (TL)	833.914,00
Başlama Tarihi	02.09.2013
Bitiş Tarihi	29.06.2014

Amasya Yarı Olimpik Yüzme Havuzu



Proje Tutarı (TL)	5.206.160,00
Toplam Harcama (TL)	5.206.160,00
Başlama Tarihi	14.12.2012
Bitiş Tarihi	06.09.2014
Kapasite (Kişi)	575

Merzifon Yarı Olimpik Yüzme Havuzu



Proje Tutarı (TL)	3.276.860,00
Toplam Harcama (TL)	3.276.860,00
Başlama Tarihi	14.09.2012
Bitiş Tarihi	14.09.2013
Kapasite (Kişi)	100

Amasya Merkez Yeşilirmak Yurdu Sosyal Tesis ve İl Müdürlüğü Yapımı



Proje Tutarı (TL)	25.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	16.376.847,46
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	70
Nakdi Gerçekleşme (%)	66

Merzifon 300 Kişilik Yurt Yapımı



Proje Tutarı (TL)	30.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.437.138,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	5
Nakdi Gerçekleşme (%)	8

Gümüşhacıköy 300 Kişilik Yurt Yapımı



Proje Tutarı (TL)	30.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	9.893.729,45
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	45
Nakdi Gerçekleşme (%)	33

İlimizde sağlık sektöründe 24 adet projede toplam 93.981.360,00 TL yatırım yapılmıştır.

**Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu
Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi**



Proje Tutarı (TL)	6.777.265,00
Bugüne Kadar Yapılan Harcama	6.777.265,00
Başlama Tarihi	30.04.1991
Bitiş Tarihi	19.04.2004
Kapasite	300 Yataklı Devlet Hastanesi

3 - 4 Hekimlik ASM - TSM - 112 ASHM



Proje Tutarı (TL)	2.729.520,00
Toplam Harcama (TL)	2.729.520,00
Başlama Tarihi	23.05.2016
Bitiş Tarihi	18.10.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina



Proje Tutarı (TL)	6.403.000,00
Toplam Harcama (TL)	6.403.000,00
Başlama Tarihi	11.03.2016
Bitiş Tarihi	08.08.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

100 Yataklı Suluova Devlet Hastanesi

Proje Tutarı (TL)	27.743.033,00
Toplam Harcama (TL)	26.474.175,00
Başlama Tarihi	07.11.2015
Bitiş Tarihi	17.08.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



Proje Tutarı (TL)	11.857.629,00
Bugüne Kadar Yapılan Harcama	11.857.629,00
Başlama Tarihi	09.11.2009
Bitiş Tarihi	21.03.2011
Kapasite	50 Yataklı R.T. FTR ve 20 Ünitelik ADSM



İlimize İl Özel İdaresince 3.898 projede 503.973.376,14 TL yatırım yapılmıştır.

İL ÖZEL İDARESİ 2003 - 2019 YATIRIM İCMALİ

	PROJE ADEDİ	SEKTÖRÜ	TOPLAM PROJE TUTARI (TL)	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (TL)
İL ÖZEL İDARESİ	2.931	ULAŞTIRMA	260.403.460,66	244.534.975,04
	341	TARIM (SULAMA)	117.976.232,52	97.946.985,61
		KİLİTLİ PARKE	5.035.980,00	5.035.980,00
	551	SOSYAL ALT YAPI	13.882.475,99	12.040.616,26
	75	KÜLTÜR DESTEK HİZ.	106.675.226,97	92.170.796,67
	TOPLAM	3.898		503.973.376,14



YATIRIM UYGULAMALARI SONUCUNDA OLUŞAN KÖYALT YAPI TESİSLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

KIRSAL ALTYAPI HİZMETLERİ	2002	2019	ARTIŞ ORANI (%)
Amasya Sulanan Arazi Varlığı (ha)	69.939	94.359	34,92
Basınçlı Sulama Hizmeti (ha)	3.396	28.057	726,17
Parke Kaplaması Bulunan Köy Sayısı	0	363	-
Asfalt Kaplama İle Ulaşılabilen Köy Sayısı	278	363	30,57
Toplulaştırma Alanı (ha)	735	9.200	1.152
Şebekeli İçme Suyu Tesisi Bulunan Köy Sayısı	319	372	16,6
Sıhhi İçme Suyu Deposu Bulunan Köy Sayısı	0	337	-
Sıhhi İçme Suyu Deposu Bulunan Mahalle Sayısı	0	60	-
Toplam Sıhhi Depo Sayısı (Bazı yerleşim yerlerinde çift depo bulunmaktadır.)	0	428	
Kanalizasyon Şebekesi Bulunan Köy Sayısı	144	372	158,33
Fosseptik Tesisi Bulunan Köy Sayısı	59	288	388



İlimize KÖYDES kapsamında 2.087 projede 153.154.932,67 TL yatırım yapılmıştır.

İlimize BELDES kapsamında 108 projede 4.647.698,00 TL yatırım yapılmıştır.

KÖYDES 2005 - 2019 YATIRIM İCMALİ

	PROJE ADEDİ	SEKTÖRÜ	TOPLAM PROJE TUTARI (TL)	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (TL)
KÖYDES	1.231	ULAŞTIRMA	47.843.533,49	47.540.503,77
		KİLİTLİ PARKE	21.413.075,18	21.413.075,18
	103	TARIM (SULAMA)	4.538.035,56	4.425.481,56
	753	SOSYAL ALT YAPI	53.420.684,14	52.018.680,05
		MUHTELİF ALIMLAR	25.939.604,30	25.939.604,30
	TOPLAM	2.087		153.154.932,67



İL ÖZEL İDARESİ VE KÖYDES YATIRIMLARI SONUCU OLUŞAN KIRSAL ALTYAPI ENVANTER TABLOSU

2003 - 2019 YILLARI İTİBARIYLA MEVCUT KÖY ALTYAPI TESİSLERİ SAYISI

TESİSİN NEVİ (KM/SAYISI)	YAPILAN			TOPLAM	YENİLENEN 2003- 2019
	2003 ÖNCESİ	2003-2018	2019 Yılı (Aralık)		
Asfalt (Km)	1.375	-276,91+307,03	70,85	1.332,52	2.695,68
Bitümlü Sıcak Asfalt	-	182,29	70,85	253,14	
Stabilize (Km)	1.315	-276,18+143,13		1.183,70	3.066,85
Tesviye (Km)	567	-313,34		253,66	2.222,80
Parke (Km)	0	33,12		33,12	
Şebekeli İçme Suyu Ünite Tesis Yapımı	399	163	1	563	731
Kanalizasyon	144	228		372	10
Fosseptik	60	227	1	288	
Atık Su Arıtma Tesisi		2		2	
Yerüstü sulaması (ha)	10.749	9.782	38	20.569	
Yeraltı sulaması (ha)	6.704	5.643	382	12.729	
Gölet Sulaması (ha)	4.344	7.887		12.231	
Sulama Göleti (Adet)	10	35	3	48	
Hayvan İçme suyu Göleti (Adet)	6	10		16	

İL ÖZEL İDARESİ PROJE ÇALIŞMASI GÖRSELLERİ



Boraboy Gölü Çevresinde Peyzaj Düzenlemesi Yapılması



Proje Tutarı (TL)	1.150.661,00
Toplam Harcama (TL)	1.055.596,00
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	90
Nakdi Gerçekleşme (%)	92



Sofular Mahallesinde Yaşam Kültürü Müzesi Restorasyon Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.003.669,06
Toplam Harcama (TL)	947.945,13
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Nakdi Gerçekleşme (%)	95




İlimiz Merkez İlçe ve İlçelerine Bağlı 30 Köye Çocuk Oyun Grubu Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.121.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.114.575,02
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Saraydüzü Caddesi ve Pir Sokakta Yol Kaldırım ve Çevre Düzenleme Yapım İşi

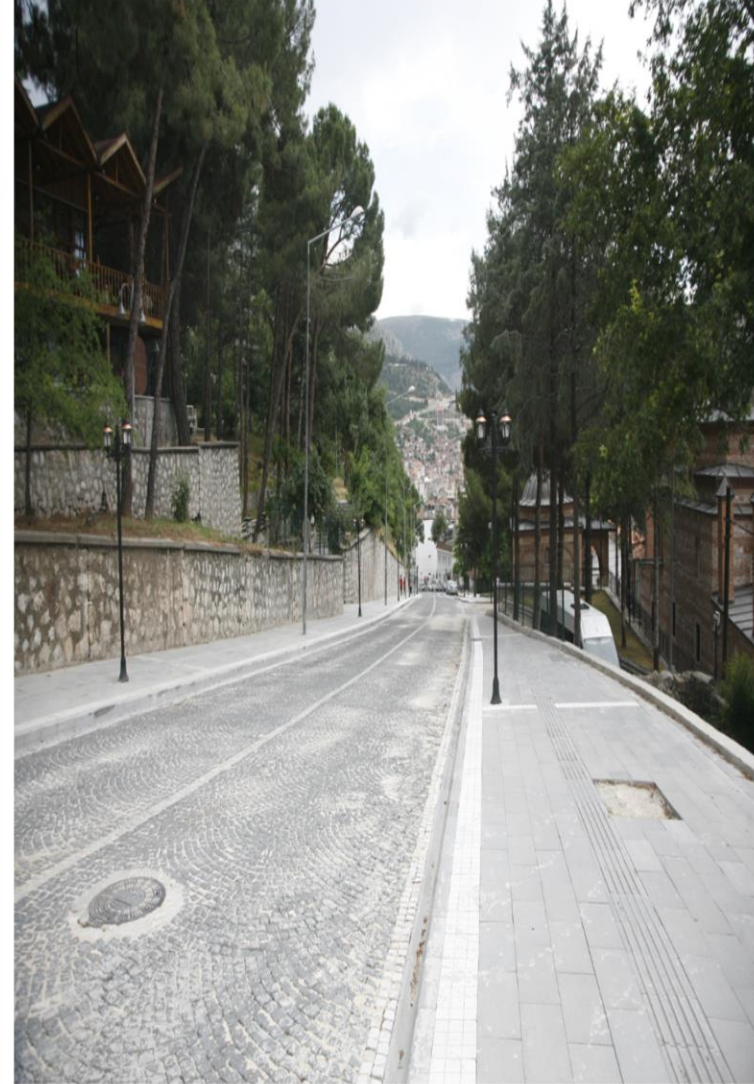

Proje Tutarı (TL)	1.411.865,36
Toplam Harcama (TL)	1.411.863,06
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Suluova - Kutlu Köyü Sulama Göleti



Proje Tutarı (TL)	4.650.000,00
Toplam Harcama (TL)	3.029.252,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Sulama Alanı (Ha)	750
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	65



Göynücek - Sazderesi Sulama Göleti



Proje Tutarı (TL)	2.981.703,00
Toplam Harcama (TL)	2.663.926,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Sulama Alanı (Ha)	250
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	89

Taşova - Kumluca Sulama Göleti



Proje Tutarı (TL)	3.250.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.701.484,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Sulama Alanı (Ha)	300
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	83

Gümüşhacıköy - Ovabaşı Gölet Onarımı Dervasyonu ve Sulama Projesi



Proje Tutarı (TL)	2.067.906,00
Toplam Harcama (TL)	1.951.211,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Sulama Alanı (Ha)	250
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	94




Taşova - Çakırsu Köyü Sulama Göleti



Proje Tutarı (TL)	3.049.116,00
Toplam Harcama (TL)	2.332.242,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Sulama Alanı (Ha)	225
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	76



Musaköy, Çiviköy, Terziköy, Başpınar Göletten Basınçlı Sulama Tesisi

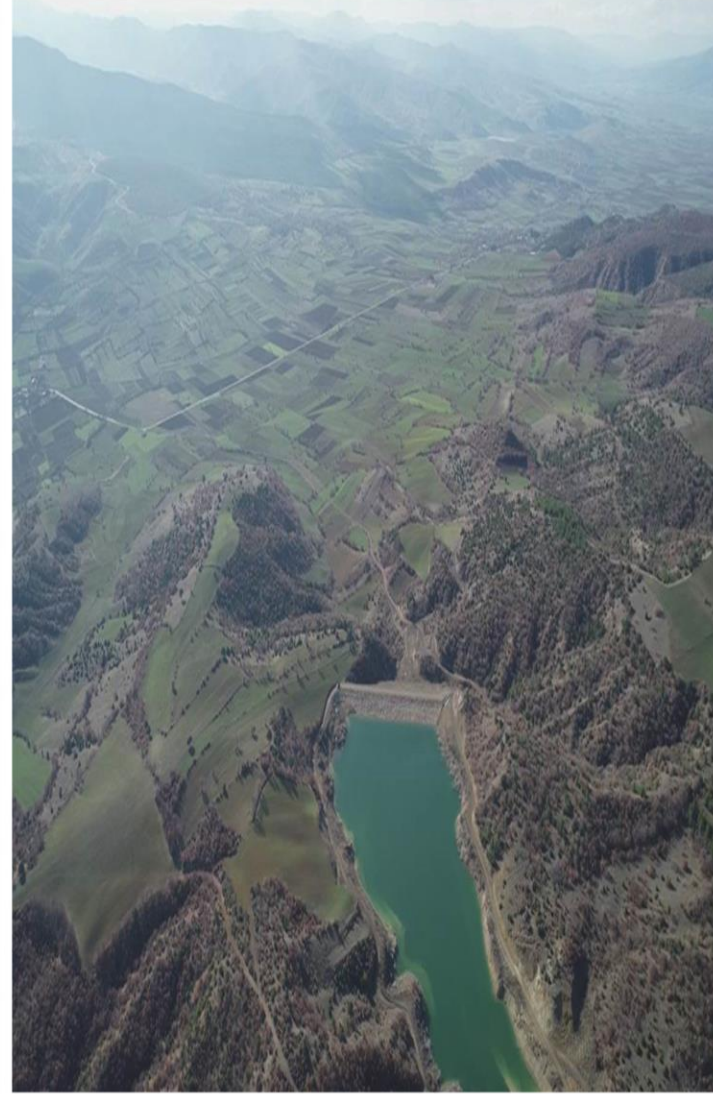

Proje Tutarı (TL)	6.138.491,00
Toplam Harcama (TL)	5.297.560,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Sulama Alanı (Ha)	1.810
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	86



İL Özel İdaresi Hizmet Binası Yapımı



Proje Tutarı (TL)	17.580.740,03
Toplam Harcama (TL)	17.580.740,03
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

İl Özel İdaresi 1 MW Lisansız Rüzgar Enerjisi Santrali Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	6.539.451,77
Toplam Harcama (TL)	6.539.451,77
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü



Proje Tutarı (TL)	3.569.650,65
Toplam Harcama (TL)	3.569.650,65
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2016




Vilayet Hükümet Konağı Onarımı



Proje Tutarı (TL)	5.021.211,89
Toplam Harcama (TL)	4.766.081,91
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2015



İlimize Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce 56 projede 3.739.618.574,43 TL yatırım yapılmıştır.

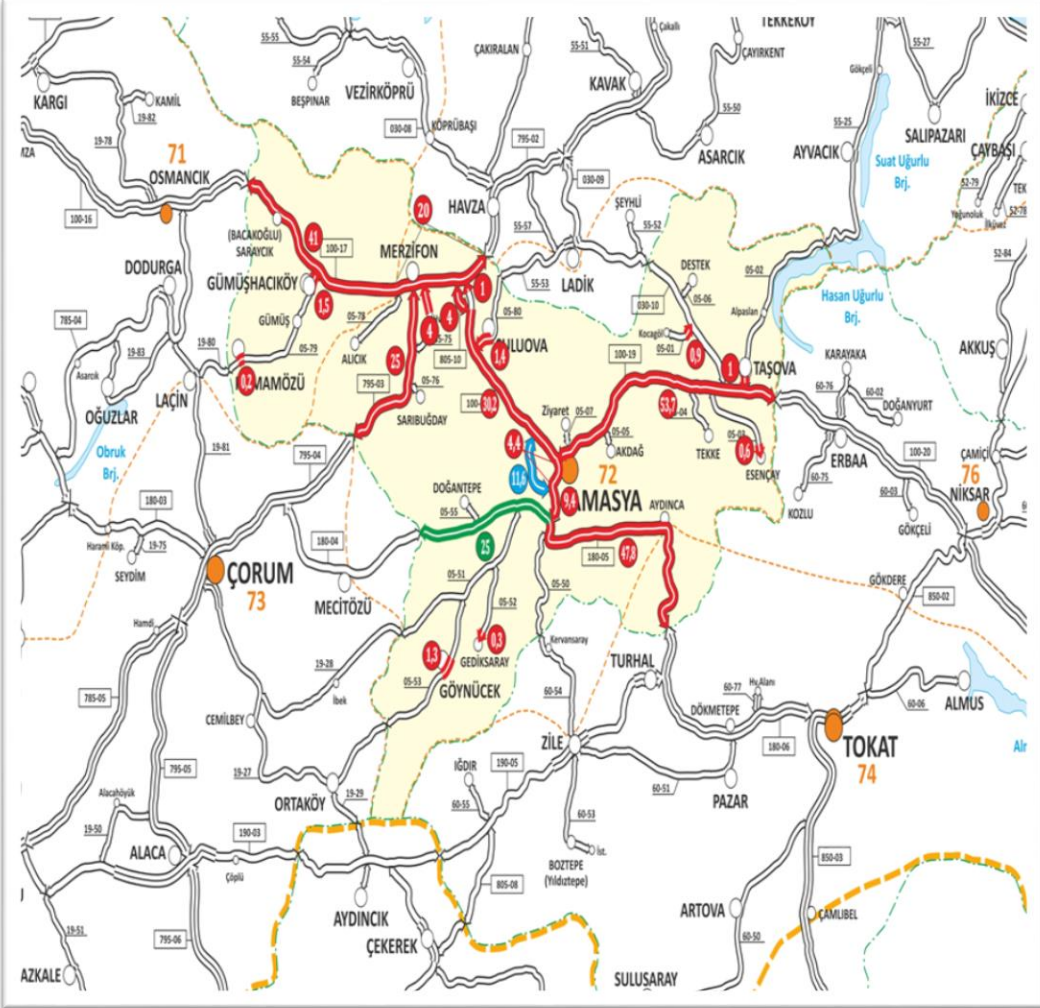

- 15. Bölge Hududu Osmancık-Merzifon Devlet Yolu
- (Merzifon-Çorum) Ayrımı-Mecitözü-(Amasya-Turhan) Ayrımı Yolu
- Amasya Çevre Yolu
- Amasya-Turhal-Tokat Arası Kavşak ve BSK İşleri İkmal İnşaatı
- Ladik-Taşova Devlet Yolu
- (Merzifon - Havza) Ayrımı - Suluova - Amasya - Taşova Yolu
- (Merzifon-Çorum) Yolu-Havaalanı Bağlantısı Arası Yol Yapım İş
- Tetek Hattı Grup Köprüleri
- Amasya-Erbaa ve (Niksar-Tokat) Ayrımı-Reşadiye Devlet Yolu
- Heyelanların Islahı


15. Bölge Hududu - Osmancık - Merzifon Devlet Yolu

Proje Tutarı (TL)	262.300.000,00
Toplam Harcama (TL)	185.300.000,00
Başlama Tarihi	2008
Bitiş Tarihi	2021
Yolun Uzunluğu (Km)	Tamamı: 119,6 Amasya: 50,6
Fiziki Gerçekleşme (%)	80
Nakdi Gerçekleşme (%)	71

(Merzifon - Çorum) Ayrımı - Mecitözü - (Amasya - Turhal) Ayrımı Yolu

Proje Tutarı (TL)	183.200.000,00
Toplam Harcama	22.500.000,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2021
Yolun Uzunluğu (Km)	Tamamı: 61,8 Amasya: 26
Fiziki Gerçekleşme (%)	20
Nakdi Gerçekleşme (%)	12

Amasya Çevre Yolu

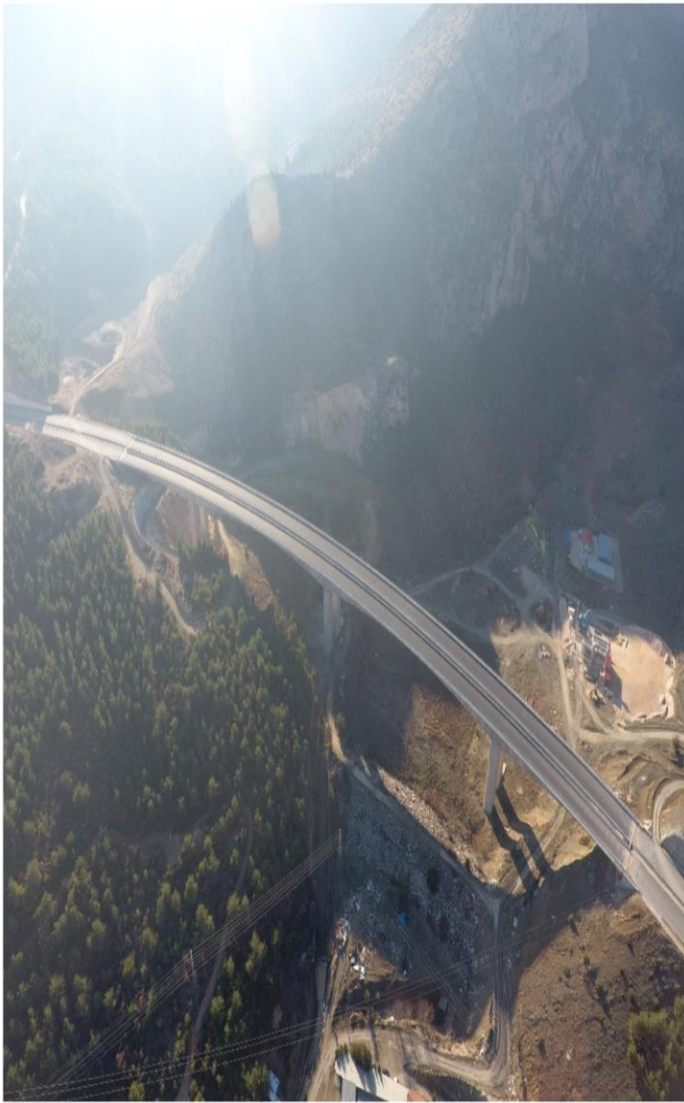

Proje Tutarı (TL)	1.159.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	873.000.000,00
Başlama Tarihi	2005
Bitiş Tarihi	2020
Yolun Uzunluğu	11,6 Km BY-BSK
Fiziki Gerçekleşme (%)	81
Nakdi Gerçekleşme (%)	75

Amasya - Turhal - Tokat Arası Kavşak ve BSK İşleri İkmal İşi

Proje Tutarı (TL)	551.600.000,00
Toplam Harcama (TL)	388.400.000,00
Başlama Tarihi	2003
Bitiş Tarihi	2020
Yolun Uzunluğu (Km)	Toplam: 102,2 İhale Edilen: 50,5 Amasya: 45,4
Fiziki Gerçekleşme (%)	85
Nakdi Gerçekleşme (%)	70

Ladik - Taşova Devlet Yolu



Proje Tutarı (TL)	74.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	42.800.000,00
Başlama Tarihi	2011
Bitiş Tarihi	2020
Yolun Uzunluğu (Km)	Tamamı: 43,9 Amasya: 26,7
Fiziki Gerçekleşme (%)	66
Nakdi Gerçekleşme (%)	57

(Merzifon - Havza) Ayrımı - Suluova - Amasya - Taşova Yolu

Proje Tutarı (TL)	295.600.000,00
Toplam Harcama (TL)	263.500.000,00
Başlama Tarihi	1998
Bitiş Tarihi	2020
Yolun Uzunluğu	46,3 Km
Fiziki Gerçekleşme (%)	93
Nakdi Gerçekleşme (%)	89

(Merzifon - Çorum) Yolu - Havaalanı Bağlantısı Arası Yol Yapım İşi

Proje Tutarı (TL)	36.800.000,00
Toplam Harcama (TL)	27.700.000,00
Başlama Tarihi	2009
Bitiş Tarihi	2020
Yolun Uzunluğu	7 Km BY-BSK
Fiziki Gerçekleşme (%)	75
Nakdi Gerçekleşme (%)	75

Tetek Hattı Grup Köprülerinin Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	9.600.000,00
Toplam Harcama (TL)	6.400.000,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2020
Amasya'daki Köprü Sayısı	4 Adet 78 m Tamamlandı
Nakdi Gerçekleşme (%)	67

Amasya - Erbaa - (Niksar - Tokat) Ayrımı - Reşadiye Devlet Yolu Heyelan Islahı

Proje Tutarı (TL)	5.026.958,00
Toplam Harcama (TL)	5.026.958,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Yolun Uzunluğu (Km)	Tamamı:5,6 Amasya:0,6
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



İlimize TCDD 4. Bölge Müdürlüğünce 42 projede 25.737.959,02 TL yatırım yapılmıştır.





Amasya Gar Binası Bekleme Salonu Tadilatı ve Çevre Düzenlemesi İşi



Proje Tutarı (TL)	1.383.583,00
Toplam Harcama (TL)	1.323.782,11
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	96

Samsun-Kalın Demiryolu hattında 20 adet hemzemin geçitte iyileştirme yapılması ve 147 adet hemzemin geçitte trafik ve bilgi levhası yapılması işi



Proje Tutarı (TL)	1.422.401,00
Toplam Harcama (TL)	1.422.401,00
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2019
Amasya	4 Adet Hemzemin geçit
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



İlimize DHMİ tarafından 8 projede 15.392.422,38 TL yatırım yapılmıştır.





İlimize İl Telekom Müdürlüğü tarafından 171 projede 24.200.288,71 TL yatırım yapılmıştır.

İlimize PTT Başmüdürlüğü tarafından 13 projede 1.841.572,29 TL yatırım yapılmıştır.



İlimize DSİ 7. Bölge Müdürlüğünce 106 projede 1.239.665.906,00 TL yatırım yapılmıştır.

AŐAĐI ÇEKEREK I. MERHALE PROJESİ

GELDİNGEN OVASI SULAMASI S0 ANAKANALI 2.KISIM İNŐAATI

GELDİNGEN OVASI SULAMASI 2. KISIM İNŐAATI

GELDİNGEN OVASI SULAMASI 3. KISIM İNŐAATI

Geldingen Ovası Sulaması S0 Anakanalı 2. Kısım İnşaatı



Proje Tutarı (TL)	13.962.615,00
Toplam Harcama (TL)	13.962.615,00
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2018
Sulama Alanı (Ha)	9.475
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Geldingen Ovası Sulaması 2. Kısım İnşaatı



Proje Tutarı (TL)	115.077.049,00
Toplam Harcama (TL)	97.486.066,00
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2019
Sulama Alanı (Ha)	9.475
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	85

Geldingen Ovası Sulaması 3. Kısım İnşaatı



Proje Tutarı (TL)	112.890.714,00
Toplam Harcama (TL)	26.882.009,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2021
Sulama Alanı (Ha)	2.735 (İhale Edilen)
Fiziki Gerçekleşme (%)	26
Nakdi Gerçekleşme (%)	24




AYDINCA PROJESİ

AYDINCA BARAJI İKMALİ İNŐAATI

AYDINCA BARAJI SULAMASI İNŐAATI


Aydınca Barajı İkmali İnşaatı

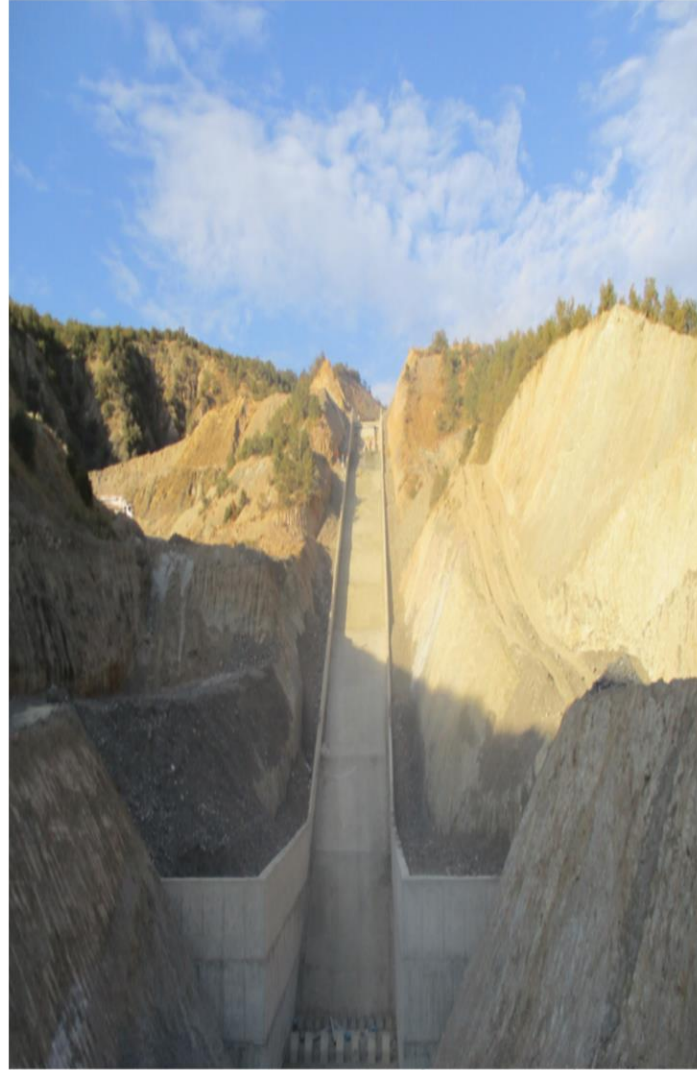

Proje Tutarı (TL)	122.457.599,00
Toplam Harcama (TL)	31.052.594,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2020
Sulama Alanı (Ha)	3.330
Fiziki Gerçekleşme (%)	30
Nakdi Gerçekleşme (%)	25



Aydınca Barajı Sulaması İnşaatı

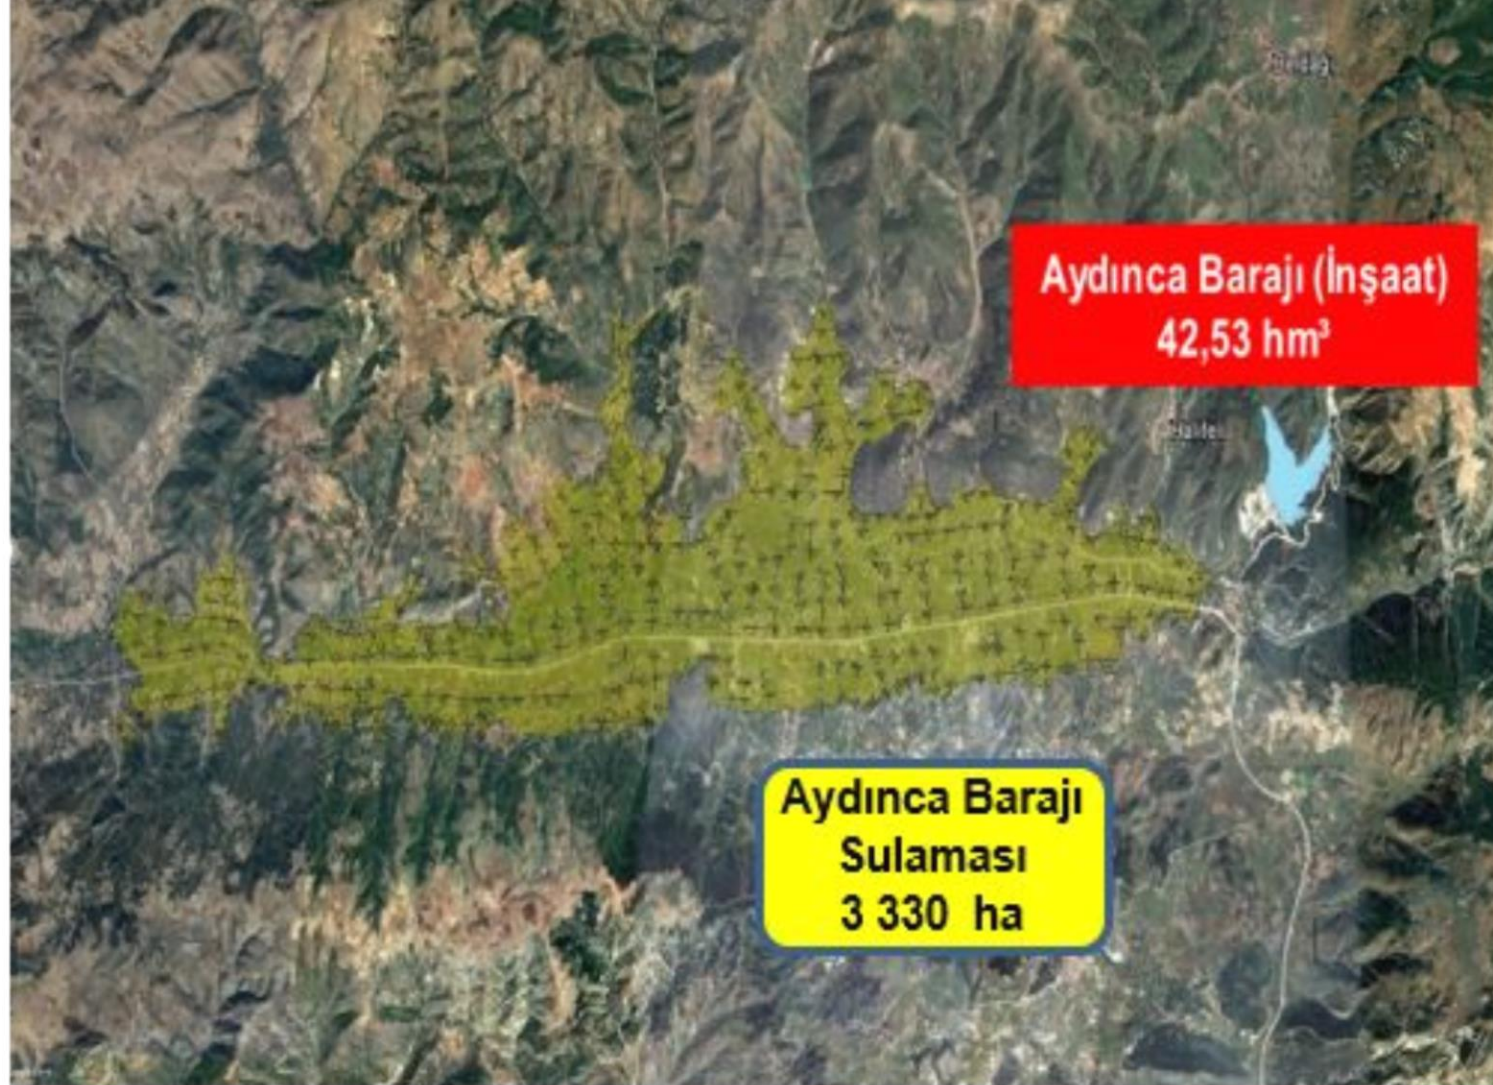

Proje Tutarı (TL)	78.956.975,00
Toplam Harcama (TL)	2.224.335,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2022
Sulama Alanı (Ha)	3.330
Fiziki Gerçekleşme (%)	3
Nakdi Gerçekleşme (%)	3



DEVAM EDEN GÖLETLER

SIRA NO	İŐİN ADI
1	Amasya-Merkez Duruca Göleti
2	Amasya-Ziyaret Saraycık Göleti
3	Amasya-Gümüşhacıköy Beden ve Saraycık Göleti

Merkez Duruca Göleti



Proje Tutarı (TL)	20.718.202,00
Toplam Harcama (TL)	16.357.375,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2020
Sulama Alanı (Ha)	111
Fiziki Gerçekleşme (%)	90
Nakdi Gerçekleşme(%)	79

Ziyaret Saraycık Göleti




Proje Tutarı (TL)	19.604.608,00
Toplam Harcama (TL)	3.966.639,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2023
Sulama Alanı (Ha)	97
Fiziki Gerçekleşme (%)	27
Nakdi Gerçekleşme(%)	20

Gümüşhacıköy Beden ve Saraycık Göletleri



Beden Göleti

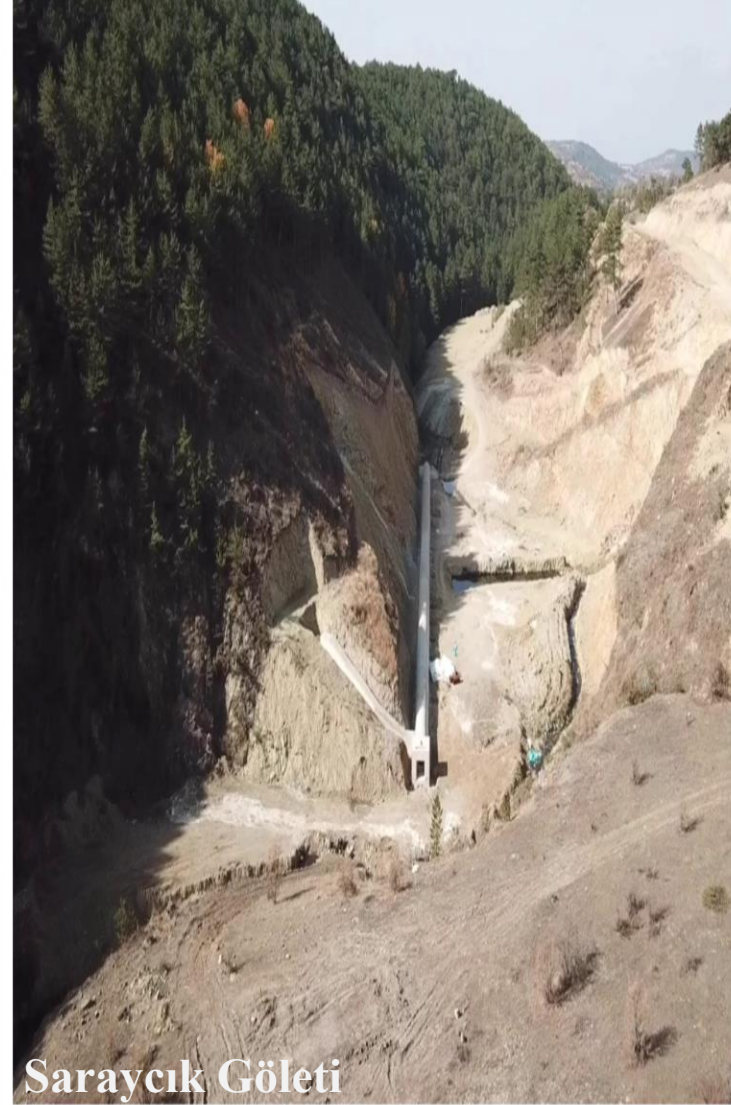


Saraycık Göleti

Proje Tutarı (TL)	42.134.071,00
Toplam Harcama (TL)	20.947.499,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	50
Nakdi Gerçekleşme (%)	50



Amasya - Suluova Geldingen Ovası TİGH ve Tarla İçi Drenaj Projesi

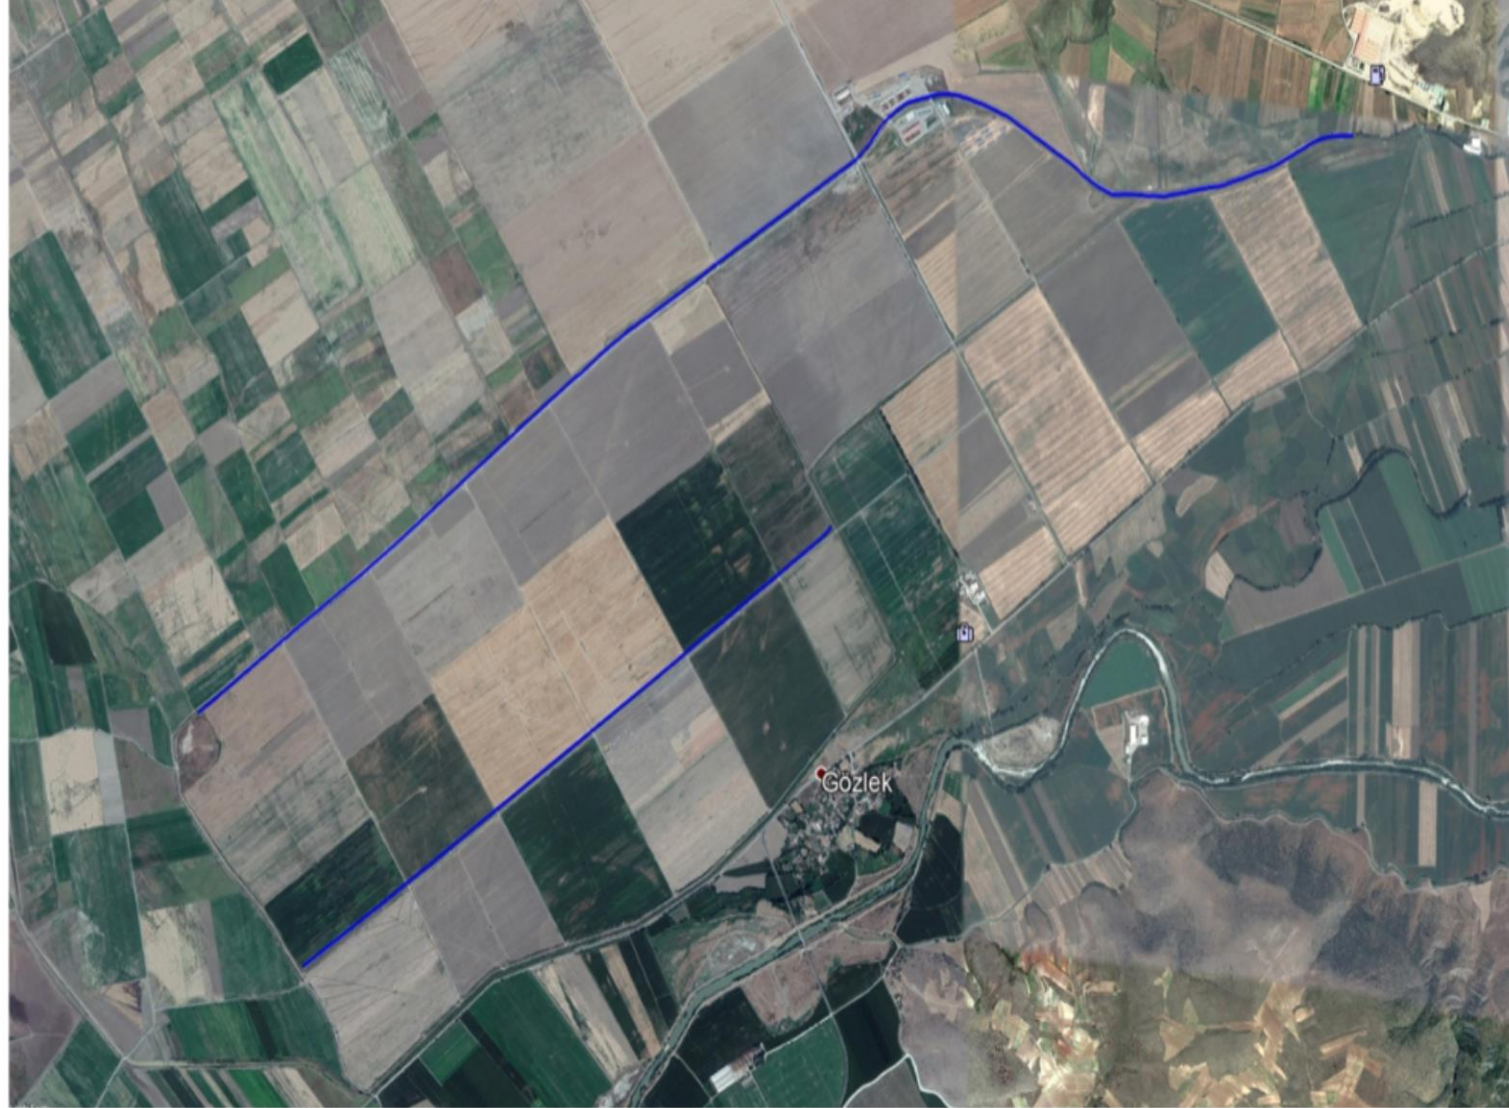

Proje Tutarı (TL)	95.881.911,00
Toplam Harcama (TL)	81.855.949,00
Başlama Tarihi	2011
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	99
Nakdi Gerçekleşme (%)	85

Çorum - Alaca ve Amasya - Suluova Geldingen Ovaları 2. Kısım Tarla İçi Drenaj, ve Rehabilitasyon ve TİGH Projesi



Proje Tutarı (TL)	48.768.291,00
Toplam Harcama (TL)	13.934.147,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	30
Nakdi Gerçekleşme (%)	29




Amasya Geldingen Ovası AT ve TİGH Projesi (Sulama + Toplulaştırma)



Proje Tutarı (TL)	23.744.221,00
Toplam Harcama (TL)	23.523.267,00
Başlama Tarihi	2009
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	99



Amasya Merzifon AT ve TİGH Projesi (Sulama + Toplulaştırma)

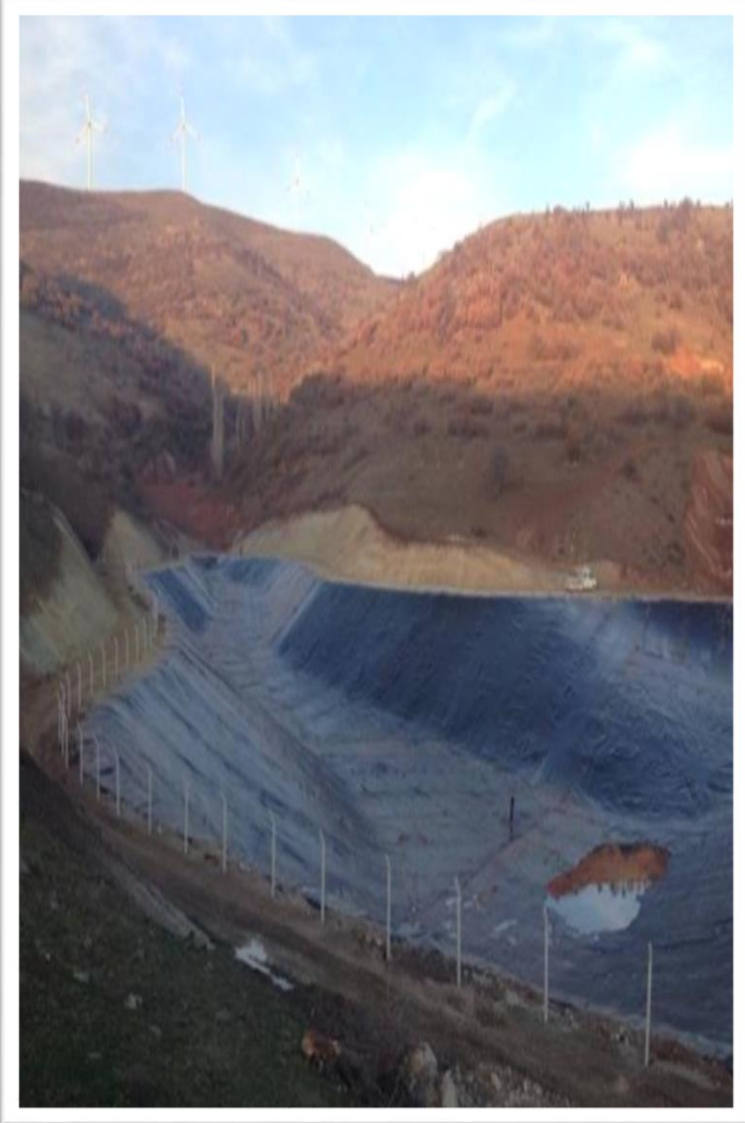

Proje Tutarı (TL)	109.999.412,00
Toplam Harcama (TL)	108.098.643,00
Başlama Tarihi	2011
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	98
Nakdi Gerçekleşme (%)	98

Amasya-İli Deliçay Havzası Yukarı Havza Yamaç Islahı



Proje Tutarı (TL)	21.056.363,00
Toplam Harcama (TL)	16.476.534,00
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	78
Nakdi Gerçekleşme (%)	78

Amasya-Merkez Ezinepazarı Kuruçay Deresi Havzası (1.Kısım) Taşkın Koruma



Proje Tutarı (TL)	7.813.694,00
Toplam Harcama (TL)	3.188.334,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	41
Nakdi Gerçekleşme (%)	41

Amasya-Küçükkızılca Tekneş Deresi Taşkın ve Rusubat Zararlarından Korunması




Proje Tutarı (TL)	4.951.768,00
Toplam Harcama (TL)	2.133.490,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2023
Fiziki Gerçekleşme (%)	43
Nakdi Gerçekleşme (%)	43

Amasya Merkez Helvacı Mahallesi Çanak Deresi Rüşbat Kontrolü



Proje Tutarı (TL)	3.276.903,00
Toplam Harcama (TL)	1.422.014,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	48
Nakdi Gerçekleşme (%)	43

Amasya-Merkez Yeşilyenice Beldesi İnşidibi Deresi Taşkın Koruma

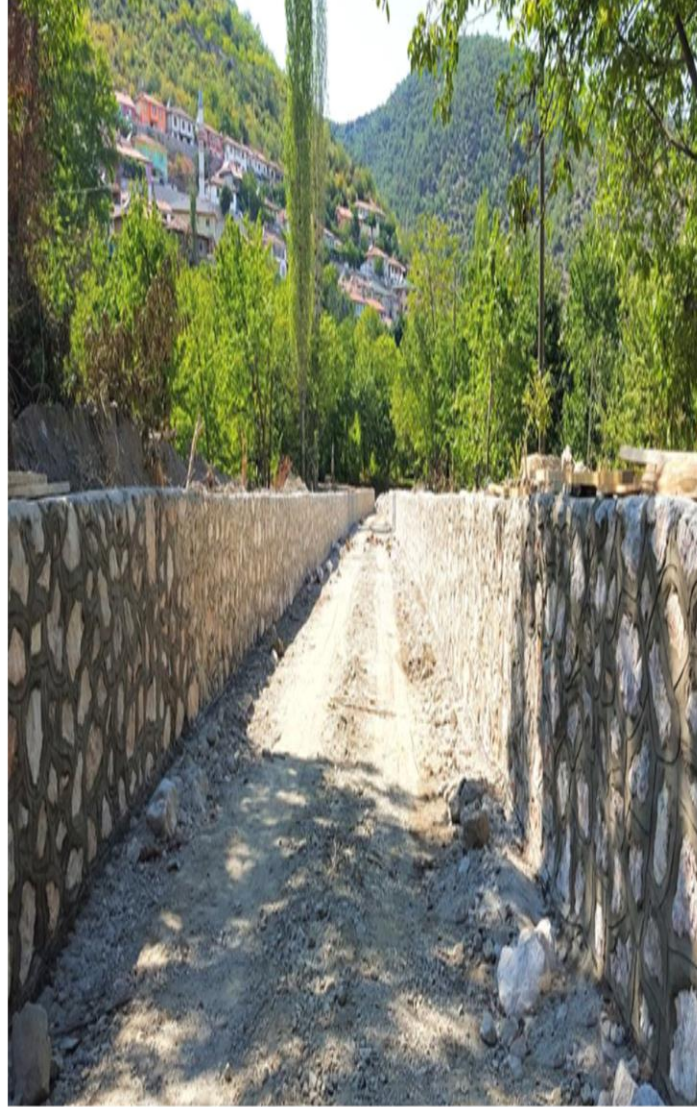

Proje Tutarı (TL)	2.113.341,00
Toplam Harcama (TL)	1.701.741,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2021
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	81

Amasya Merzifon İlçesi Yakacak Küçük Depolama Tesisi



Proje Tutarı (TL)	4.317.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.714.962,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	45
Nakdi Gerçekleşme (%)	40

Merkez Ağılönü Göleti



Proje Tutarı (TL)	4.459.812,00
Toplam Harcama (TL)	3.890.147,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Sulama Alanı (Ha)	82
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	87



TARIM - ORMANCILIK

ORMAN BÖLGE MÜRÜRLÜĞÜ

İlimize Orman Bölge Müdürlüğüne 105 projede 410.453.000,00 TL yatırım yapılmıştır.

Yangın İlk Müdahale Ekip Binası



Orman Yolu Üst Yapı Çalışması



İlimize Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğünce 37 projede 4.365.176,00 TL yatırım yapılmıştır.

Boraboy Tabiat Parkı Alt Yapı Çalışması



Proje Tutarı (TL)	800.000,00
Toplam Harcama (TL)	705.233,00
Başlama Tarihi	01.01.2014
Bitiş Tarihi	31.12.2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	88
Nakdi Gerçekleşme (%)	88

Sulak Alanların Korunması, Tanzimi ve Rehabilitasyonu (Yedikır Gölü Çevre Düzenlemesi ve Kamera Sistemi Yapımı)



Proje Tutarı (TL)	500.000,00
Toplam Harcama (TL)	499.963,80
Başlama Tarihi	01.01.2017
Bitiş Tarihi	31.12.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi



Proje Tutarı (TL)	287.000,00
Toplam Harcama (TL)	287.000,00
Başlama Tarihi	02.01.2015
Bitiş Tarihi	31.12.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



İlimize Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından 19 projede 1.470.703,00 TL yatırım yapılmıştır.



14 Adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ)

Amasya, Amasya/Gökhöyük Tigem,
Amasya/Beldağı Köyü,
Göynücek, Gümüşhacıköy
Hamamözü, Merzifon,
Merzifon/Çaybaşı Köyü, Merzifon/Tavşan
Dağı, Suluova, Taşova, Taşova/Boraboy
Orman Sahası, Taşova/Boraboy Gölü.
Amasya Merkez/Akdağ

1 Adet Havaalanı OMGİ

•Amasya Merzifon Havalimanı

İlimize Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce 24 projede 47.940.502,83 TL yatırım yapılmıştır.

Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	6.691.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.699.938,43
Başlama Tarihi	02.10.2017
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	55
Nakdi Gerçekleşme (%)	40

1.000 Kişilik Yurt Binası

Proje Tutarı (TL)	38.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	33.047.505,45
Başlama Tarihi	11.11.2015
Bitiş Tarihi	19.01.2018
Kapasite	4 Adet Yurt Bloğu+1 Adet Sosyal Tesis
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	87

Merzifon İlçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası



Proje Tutarı (TL)	2.500.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.776.392,73
Başlama Tarihi	11.11.2015
Bitiş Tarihi	11.04.2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	71

İl Gıda Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası



Proje Tutarı (TL)	4.700.000,00
Toplam Harcama (TL)	4.217.359,43
Başlama Tarihi	31.10.2013
Bitiş Tarihi	22.12.2015
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	90

İlimize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 17 projede 39.425.438,08 TL yatırım yapılmıştır.

Amasya Kalesinin Restorasyonu



Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi



Şehzadeler Müzesi






Darüşşifa Sabuncuođlu Tıp ve Cerrahi Müzesi



Minyatür Amasya 1914 Kent Modeli



Amasya Tarihi Köprülerinin Restorasyonu

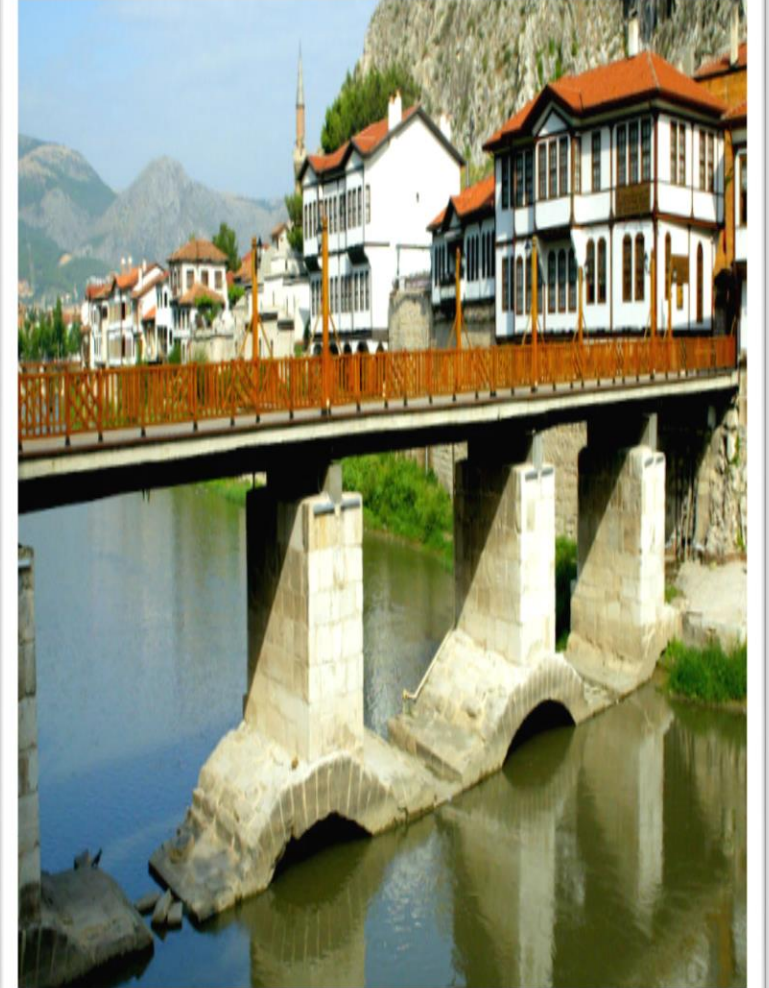



Merzifon Akif Glle Kltr Merkezi



Taşhan'ın Restorasyonu





Sofular Sokak Saėlıklaştırma Projesi





Ferhat İle Őirin Műzesi





İlimize Vakıflar Genel Müdürlüğünce 105 projede 58.053.038,89 TL yatırım yapılmıştır.

Amasya Merkez II. Beyazıt Külliyesi Restorasyonu

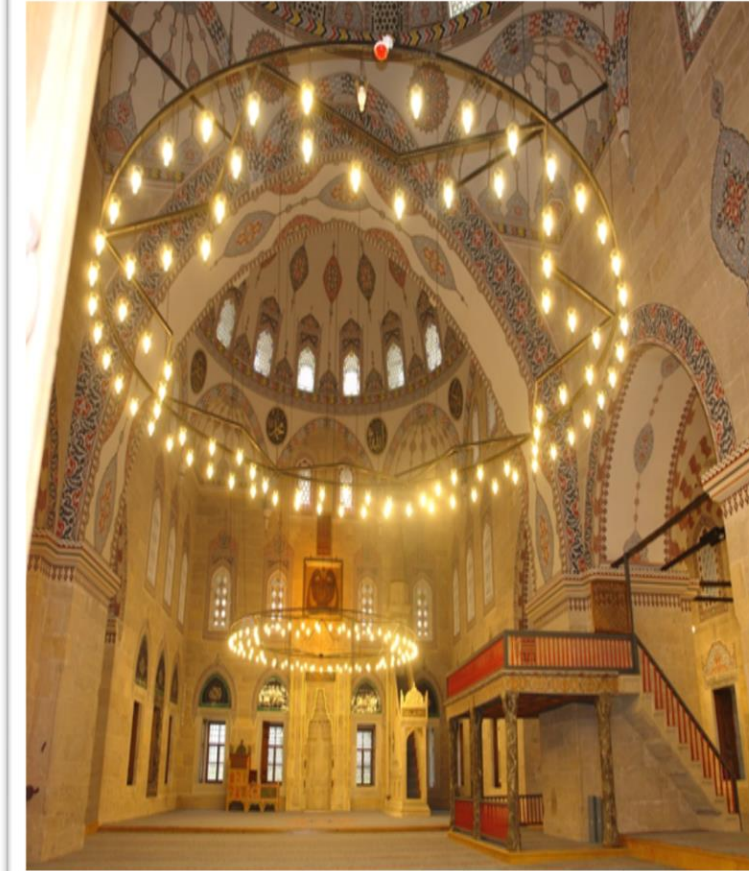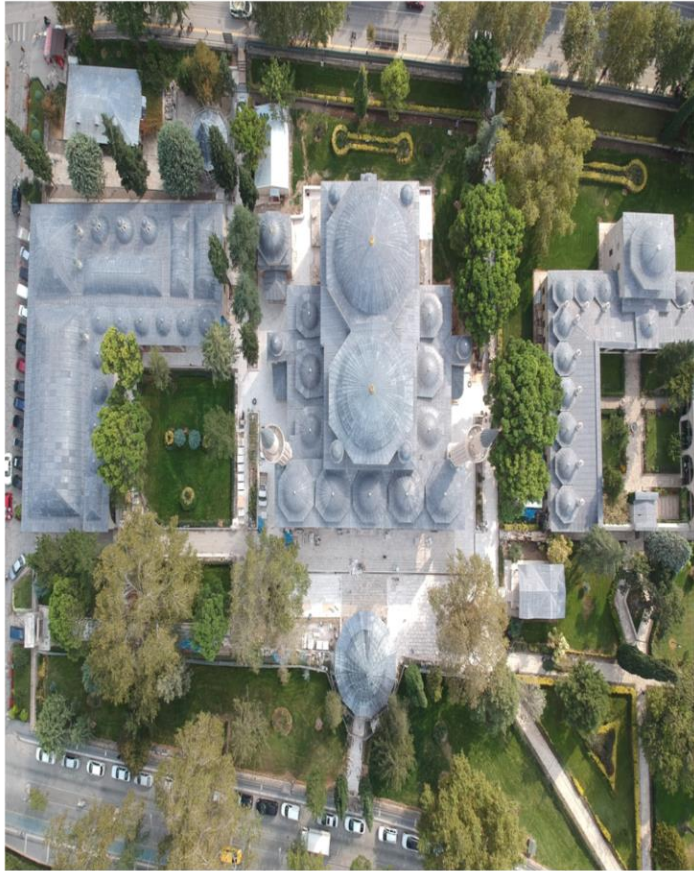

Proje Tutarı (TL)	12.977.498,86
Toplam Harcama (TL)	12.977.498,86
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Merkez Gökmedrese Cami ile Torumtay Türbesi Onarım İşi



Proje Tutarı (TL)	7.827.418,83
Toplam Harcama (TL)	6.201.340,01
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Nakdi Gerçekleşme (%)	79



Amasya İş Merkezi Yapımı



Proje Tutarı (TL)	2.619.582,26
Toplam Harcama (TL)	2.619.582,26
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Merzifon Sofular Cami ile Üçler Türbesi 2017-2018 Yılları Onarım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.374.965,28
Toplam Harcama (TL)	1.374.965,28
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası



Proje Tutarı (TL)	3.988.382,25
Toplam Harcama (TL)	3.988.382,25
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Müftülük Hizmet Binası Yapımı



Proje Tutarı (TL)	6.675.000,00
Toplam Harcama (TL)	3.143.423,09
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	40
Nakdi Gerçekleşme (%)	47



İlimize İller Bankası A.Ş. tarafından 92 projede 147.389.878,00 TL yatırım yapılmıştır.

Amasya Şehir İçi Ferhat Tüneli Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	24.373.325,06
Toplam Harcama (TL)	24.373.325,06
Başlama Tarihi	02.12.2015
Bitiş Tarihi	23.04.2018
Uzunluğu (m)	958
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması



Proje Tutarı (TL)	2.958.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.958.000,00
Başlama Tarihi	30.04.2018
Bitiş Tarihi	31.12.2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Amasya Belediyesi İtfaiye Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.666.436,02
Toplam Harcama (TL)	1.666.436,02
Başlama Tarihi	25.04.2016
Bitiş Tarihi	09.02.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100




Amasya (Merkez) Şirin Taşıt Köprüsü Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.330.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.330.000,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Amasya Belediyesi Bahçeleriçi Mahallesi Yarı Kapalı Pazar Yeri Yapım İşi

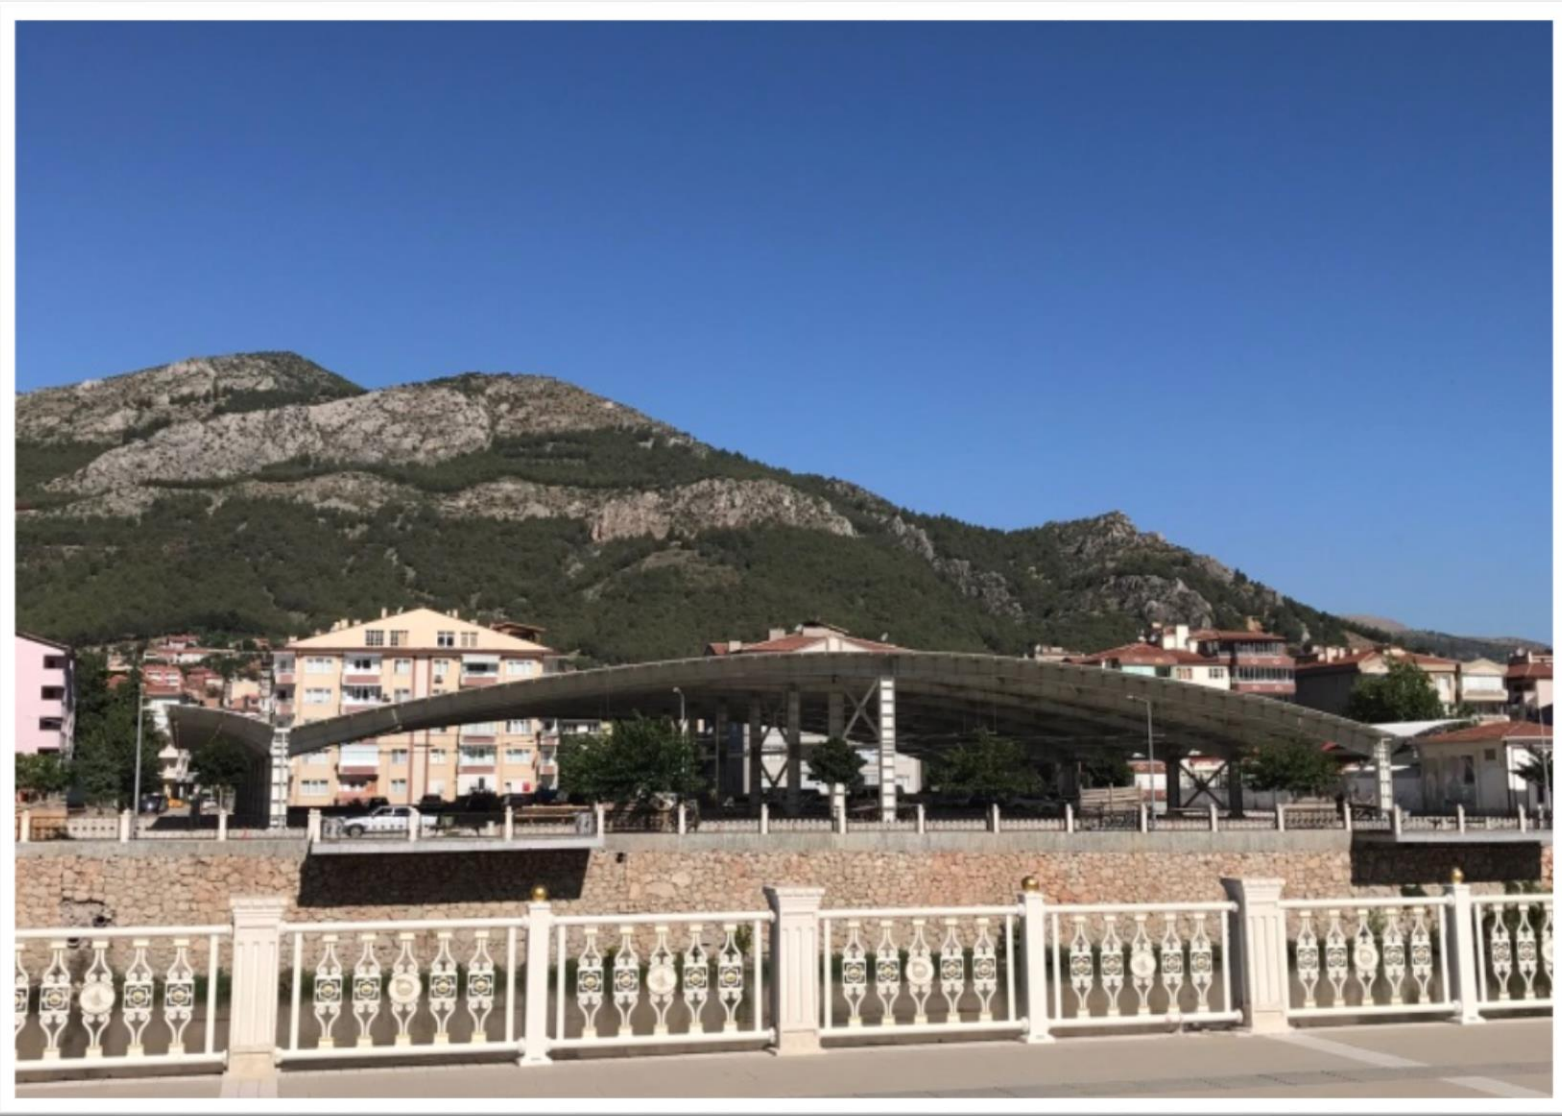

Proje Tutarı (TL)	1.404.632,17
Toplam Harcama (TL)	1.404.632,17
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Amasya (Merkez) Yağmur Suyu Şebeke İnşaatı



Proje Tutarı (TL)	11.570.369,35
Toplam Harcama (TL)	11.570.369,35
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Göynücek Belediyesi Hizmet Binası Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	1.632.655,07
Toplam Harcama (TL)	1.632.655,07
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



İçmesuyu ve Kanalizasyon Altyapı Sistemlerinin Yenilenmesi



Proje Tutarı (TL)	8.829.227,60
Toplam Harcama (TL)	8.829.227,60
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Hamamözü Halk Tipi Termal Hamam Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	3.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	3.000.000,00
Başlama Tarihi	14.11.2016
Bitiş Tarihi	10.04.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Merzifon Yağmur Suyu Kanalı İnşaâtı



Proje Tutarı (TL)	14.655.600,00
Toplam Harcama (TL)	355.531,22
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	2



Atık Su Arıtma Tesisi



Proje Tutarı (TL)	1.915.920,00
Toplam Harcama (TL)	653.597,71
Başlama Tarihi	2009
Bitiş Tarihi	2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	34



Sosyal Kültürel Tesis Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	2.758.249,98
Toplam Harcama (TL)	2.758.249,98
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Ziyaret İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi



Proje Tutarı (TL)	512.372,00
Toplam Harcama (TL)	507.336,00
Başlama Tarihi	17.02.2017
Bitiş Tarihi	30.11.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



İlimize Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 3 projede 73.640.515,00 TL yatırım yapılmıştır.

Amasya-Merzifon (TEVSİİ) OSB/187 Ha +Hizmet Binası



Proje Tutarı (TL)	12.872.000,00
Toplam Harcama (TL)	877.887
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2022
Fiziki Gerçekleşme (%)	7
Nakdi Gerçekleşme (%)	7



Proje Tutarı (TL)	17.575.130,43
Toplam Harcama (TL)	9.624.060,63
Başlama Tarihi	13.08.2007
Bitiş Tarihi	06.04.2014
Yüzölçümü (ha)	99
Toplam Parsel	40

İlimize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 3 projede 19.451.980,00 TL harcama yapılmıştır.

Şeyhcuî Mahallesi ve Göllü Bağları Mevkiinde Yapılan 167 Afet Konutu



Proje Tutarı (TL)	17.480.520,00
Toplam Harcama (TL)	17.480.520,00
Başlama Tarihi	02.06.2015
Bitiş Tarihi	22.01.2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

KONUT

TOKİ

TOKİ Başkanlığınca; 2003 - 2019 yıllarında Amasya iline tamamlanan ve devam eden işler için 578,3 Milyon TL'lik yatırım yapılmıştır.



Amasya İli TOKİ Yatırımları	Adet
Konut Sayısı	4.839
Kamu Hizmet Binası	1
Okul	3
Hastane	1
Cami	9
Ticaret Merkezi	7
Diğer (Pansiyon, Sevgi Evi. Büfe)	4





TEİAŞ - YEDAŞ - AKSA DOĞALGAZ - ESKİ ÇELTEK KÖMÜR İŞLETMELERİ - MTA



İlimize TEİAŞ tarafından 42 projede 634.535.022,00 TL yatırım yapılmıştır.

İlimize YEDAŞ tarafından 529 projede 187.440.276,71 TL yatırım yapılmıştır.

İlimize AKSA DOĞALGAZ tarafından 5 projede 89.000.000,00 TL yatırım yapılmıştır.

İlimize Eski Çeltek Kömür İşletmeleri tarafından 5 projede 44.632.100,00 TL yatırım yapılmıştır.

İlimize MTA tarafından 32 projede 99.079.825,00 TL yatırım yapılmıştır.



İlimize Adalet Bakanlığınca 5 projede 45.289.000,00 TL yatırım yapılmıştır.

Amasya Adalet Sarayı



Proje Tutarı (TL)	10.196.000,00
Başlama Tarihi	2009
Bitiş Tarihi	2010



Taşova Adliye Binası Yapımı



Proje Tutarı (TL)	8.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	7.779.370,45
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	99
Nakdi Gerçekleşme (%)	97

Yeşilkent 1 Meydan Düzenlemesi ve Bina Yapımı



Proje Tutarı (TL)	2.926.400,00
Toplam Harcama (TL)	0
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	10
Nakdi Gerçekleşme (%)	0

21. Y.Y. Yavuz Selim Meydanı Düzenleme İşi Yapımı



Proje Tutarı (TL)	1.137.431,36
Toplam Harcama (TL)	0
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	3
Nakdi Gerçekleşme (%)	0

**Bisiklet Yolları ve Yürüyüş Yolları Yapımı**

Proje Tutarı (TL)	2.703.970,00
Toplam Harcama (TL)	1.694.900,00
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	80
Nakdi Gerçekleşme (%)	63

Pompa İstasyonlarına Scada Yapılması ve Mevcut Scada Yazılımının Revizyonu



Proje Tutarı (TL)	2.400.124,72
Toplam Harcama (TL)	1.887.977,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	79

Müzikli, Işıklı, Danslı Fıskiye Sistemi Yapımı



Proje Tutarı (TL)	867.300,00
Toplam Harcama (TL)	867.300,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Amasya Belediyesi Sergi ve Müze Binası Lastik Bendi ve Yenilenebilir Enerji Çevre Peyzaj Düzenlemesi Yapımı



Proje Tutarı (TL)	15.831.628,22
Toplam Harcama (TL)	15.831.628,22
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Yalıboyu Evlerinin Karşındaki Yansıması Projesi



Proje Tutarı (TL)	1.408.276,69
Toplam Harcama (TL)	1.408.276,69
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Hat Müzesi Yapımı



Proje Tutarı (TL)	451.861,70
Toplam Harcama (TL)	451.861,70
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Hızırpaşa Kale Yolu Yapımı



Proje Tutarı (TL)	2.500.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.500.000,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2017
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Engelsiz Yaşam Parkı



Proje Tutarı (TL)	397.500,00
Toplam Harcama (TL)	397.500,00
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2014



Otogar Yapımı



Proje Tutarı (TL)	146.900,00
Toplam Harcama (TL)	146.900,00
Başlama Tarihi	2013
Bitiş Tarihi	2013

Yaş Sebze ve Meyve Hali Binası

Proje Tutarı (TL)	6.396.547,58
Toplam Harcama (TL)	6.396.547,58
Başlama Tarihi	2010
Bitiş Tarihi	2012
Alan (m ²)	51.400



İş Merkezi ve Otel Yapımı



Proje Tutarı (TL)	4.167.428,00
Toplam Harcama (TL)	3.835.164,41
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	93
Nakdi Gerçekleşme (%)	93



Küçük Sanayi Dükkanları Yapımı



Proje Tutarı (TL)	1.361.670,30
Toplam Harcama (TL)	630.000,00
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	44
Nakdi Gerçekleşme (%)	46



İş ve Yaşam Merkezi Yapımı



Proje Tutarı (TL)	8.488.920,00
Toplam Harcama (TL)	7.737.697,66
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2020
Fiziki Gerçekleşme (%)	90
Nakdi Gerçekleşme (%)	91



Otopark Yapımı



Proje Tutarı (TL)	1.500.000,00
Toplam Harcama (TL)	1.500.000,00
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Mezbahane Yapımı



Proje Tutarı (TL)	1.039.279,81
Toplam Harcama (TL)	1.039.279,81
Başlama Tarihi	2018
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100

Kaldırım ve Parke Yol Çalışmaları



Proje Tutarı (TL)	6.994.942,61
Toplam Harcama (TL)	6.994.942,61
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



Belediyemiz Makine ve İkmal Kampüsü Yapımı



Proje Tutarı (TL)	4.000.000,00
Toplam Harcama (TL)	2.932.678,33
Başlama Tarihi	2015
Bitiş Tarihi	2019
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	73



Belediye Hizmet Binası Yapımı



Proje Tutarı (TL)	6.400.000,00
Toplam Harcama (TL)	6.293.740,80
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98



Kültür Merkezi



Proje Tutarı (TL)	4.914.750,00
Toplam Harcama (TL)	4.828.824,04
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	98



Şehirlerarası Otobüs Terminali Yapımı




Proje Tutarı (TL)	1.656.762,00
Toplam Harcama (TL)	1.586.762,00
Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	96

Otogalericiler Sitesi



Proje Tutarı (TL)	2.336.400,00
Toplam Harcama (TL)	2.336.400,00
Başlama Tarihi	2017
Bitiş Tarihi	2018
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Nakdi Gerçekleşme (%)	100



T.C.
Amasya Valiliği
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
